

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório nº	1
		Data do relatório	01/08/2022
		Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (12)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 3	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (11)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (5)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1		

Atividades (3)	
- EXECUÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXAS COLETORAS.	Em Andamento
- ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL PARA CARREGAR PARA TRECHO.	Concluída
- INÍCIO DE LIMPEZA EM POSSÍVEL JAZIDA.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (6)	
 <p>- Início de limpeza em possível jazida;</p>	 <p>- Início de limpeza em possível jazida;</p>



Execução de tampas para caixas coletoras;



Execução de tampas para caixas coletoras;



Execução de tampas para caixas coletoras;



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório n°	2
		Data do relatório	02/08/2022
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (12)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 3	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (11)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (5)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1		

Atividades (2)	
- EXECUÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXAS COLETORAS.	Concluída
- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO: passagens de drenagens.	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (10)



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- EXECUÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXAS COLETORAS.

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório n°	3
		Data do relatório	03/08/2022
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (12)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 3	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (11)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (5)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1		

Atividades (2)	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E11: Foram executados 11m de bueiro.	Concluída
- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO: passagens de drenagens no trecho em Santa Teresa.	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (10)



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- CHEGADA DE MANILHAS E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS NOS PONTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO;



- Motoniveladora em trabalho realizando o assentamento dos bueiros;



- Motoniveladora em trabalho realizando o assentamento dos bueiros;



- Abertura para execução de caixa coletora;



- Motoniveladora em trabalho realizando o assentamento dos bueiros;



- Abertura da vala para fluxo de água;



- Motoniveladora em trabalho realizando o assentamento dos bueiros;

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório n°	4
		Data do relatório	04/08/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (12)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 3	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (11)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (5)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1		

Atividades (2)	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E27: Foram executados 9m de bueiro.	Concluída
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E50: Foram executados 11m de bueiro.	Concluída

Ocorrências (1)
- Troca de maquinário: Retroescavadeira.

Comentários (0)

Galeria de Fotos (13)



- Troca de maquinário: Retroescavadeira.



- Execução de BSTC na E27;



- Execução de BSTC na E27;



- Execução de BSTC na E27;



- Execução de BSTC na E27;



- Execução de BSTC na E27;



- Execução de BSTC na E50;



- Execução de BSTC na E50;



- Execução de BSTC na E50;



- Execução de BSTC na E50;



- Execução de BSTC na E50;



- Execução de BSTC na E50;

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório nº	5
		Data do relatório	05/08/2022
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (12)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 3	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (11)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (5)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1		

Atividades (2)	
- TENTATIVA DE EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84.	Em Andamento
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E116: Foram executados 10m de bueiro.	Concluída



Ocorrências (1)
- Na região de corte para execução de bueiro o solo estava muito duro e compactado, demandando muito tempo de trabalho, conseqüentemente, o dia foi pouco produtivo. Horas Improdutivas

Comentários (0)

Galeria de Fotos (2)	
	

- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E116;

- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E116;

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	6
				Data do relatório	08/08/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	8 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen	Prazo a vencer	114 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (8)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1

Atividades (2)	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84: Foram executados 5m de bueiro.	Concluída
- INÍCIO DE LIMPEZA DO TRECHO: E00 a E60;	Em Andamento

Ocorrências (1)
- CHEGADA DE MATERIAL: Blocos estruturais. Chegada de Material

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	

- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84;

- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84;



- Chegada de maquinário: motoniveladora.



- Chegada de material.

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	7	
				Data do relatório	09/08/2022	
				Dia da semana	Terça-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022	
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES					
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES					
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen			
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1						
Atividades (3)						
- LIMPEZA DO TRECHO: E60 a E140;					Em Andamento	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84: Foram executados 6m de bueiro.					Concluída	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E73: Foram executados 11m de bueiro.					Concluída	
Ocorrências (1)						
- Caminhão basculante vermelho quebrado: problema elétrico no arranque, dia todo cortado. Maquinário com defeito						
Comentários (0)						
Galeria de Fotos (15)						



- Transporte de material para ponto de execução.



- Caminhão basculante parado, por conta de defeito.



- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84;



- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84;



- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E84;



- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E73;



- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E73;



- EXECUÇÃO DE BSTC Ø80 NA E73;



- Limpeza do trecho;



- Limpeza do trecho;



- Limpeza do trecho;



- Limpeza do trecho;



- Limpeza do trecho;



- Limpeza do trecho;



- Limpeza do trecho;

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	8	
				Data do relatório	10/08/2022	
				Dia da semana	Quarta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022	
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES					
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES					
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen			
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☁ Nublado		Praticável		
Tarde		☁ Nublado		Praticável		
Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 1		<i>Mão de Obra Direta (15)</i>	
Engenheiro 1					<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>	
Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1						
Atividades (3)						
- LIMPEZA DO TRECHO: E140 a E185;					Concluída	
- LIMPEZA DE JAZIDA/EMPRÉSTIMO;					Em Andamento	
- EXECUÇÃO DE BOCA DE ALA NA E73;					Em Andamento	
Ocorrências (0)						
Comentários (0)						
Galeria de Fotos (9)						



- LIMPEZA DE JAZIDA/EMPRÉSTIMO;



- LIMPEZA DE JAZIDA/EMPRÉSTIMO;



- LIMPEZA DO TRECHO: E140 a E185;



- LIMPEZA DO TRECHO: E140 a E185;



- LIMPEZA DO TRECHO;



- LIMPEZA DO TRECHO;



- EXECUÇÃO DE BOCA DE ALA NA E73;



- EXECUÇÃO DE BOCA DE ALA NA E73;



- EXECUÇÃO DE BOCA DE ALA NA E73;

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório n°	9
		Data do relatório	11/08/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1						

Atividades (3)	
- Regularização/recobrimento da E00 a E12;	Em Andamento
- Execução de 01 caixa coletora e 01 boca de ala na E09;	Concluída
- Preparação de fundo na E12 para execução da caixa e ala;	Em Andamento

Ocorrências (0)


Comentários (0)

Galeria de Fotos (14)







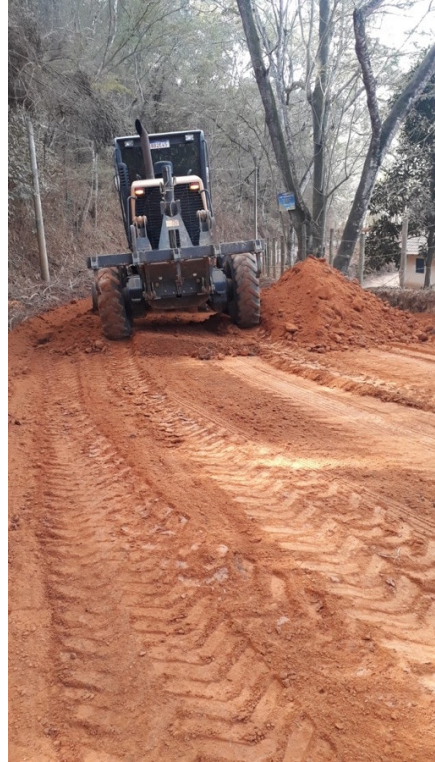

GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	10	
				Data do relatório	12/08/2022	
				Dia da semana	Sexta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022	
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES					
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES					
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen			
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☁ Nublado		Praticável		
Tarde		☁ Nublado		Praticável		
Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 1			<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>
Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1					
Atividades (2)						
- Regularização/recobrimento da E12 a E20;					Em Andamento	
- Execução de 01 caixa coletora e 01 boca de ala na E21;					Em Andamento	
Ocorrências (1)						
- Chegada de Rolo Compactador;						
Comentários (0)						
Galeria de Fotos (7)						





GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório nº	11
		Data do relatório	16/08/2022
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 5	Encarregado 1	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Trator com Grade 1				

Atividades (4)	
- Regularização/recobrimento da E20 a E38;	Em Andamento
- Execução de 02 bocas de ala diam. 80cm na E50;	Concluída
- Aterro de caixas coletoras;	Em Andamento
- Início de execução de 01 caixa coletora e 01 boca de ala diam. 80cm na E84;	Em Andamento

Ocorrências (2)	
- Compra de Óleo S15W40, 3L para Caminhão Pipa.	
- Conserto de Betoneira: solda da perna.	

Comentários (0)	

Galeria de Fotos (19)	











GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório nº	12
		Data do relatório	17/08/2022
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (17)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (16)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Trator com Grade 1				

Atividades (4)	
- Regularização/recobrimento da E38 a E49;	Em Andamento
- Aterro de caixas coletoras;	Em Andamento
- Execução de 01 caixa coletora e 01 boca de ala diam. 80cm na E84;	Paralisada
- Execução de 02 boca de ala diam. 60cm na E113;	Concluída

Ocorrências (4)
- Impedimento de execução de Caixa e Boca de Ala na E84 por parte do morador. Precisou ir atrás do mesmo para conversa e solicitar autorização do serviço.
- Dia de abastecimento das máquinas sempre atrasa um pouco a produção;
- Chegada do segundo Caminhão Pipa na obra, porém o mesmo será trocado por outro menor para facilitar a logística na obra. Além de todo acionamento ser manual, podendo atrasar na execução do serviço.
- Rolo Compactador com defeito no alternador: dia parado. Maquinário com defeito


Comentários (0)

Galeria de Fotos (9)








GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA


Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA		Relatório nº	13
		Data do relatório	18/08/2022
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES		
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES		
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Thais Effgen

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (17)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 1			Mão de Obra Direta (16)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Compactador de solo do tipo sapo 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Motoniveladora 1
Escavadeira 1	Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Trator com Grade 1				

Atividades (5)	
- Regularização/recobrimento da E49 a E78 (580m);	Em Andamento
- Aterro de caixas coletoras;	Em Andamento
- Execução de 01 caixa coletora e 01 boca de ala diam. 80cm na E84;	Concluída
- Execução de 01 caixa coletora diam. 40cm na E85;	Em Andamento
- Execução de travessia de BSTC diam. 40cm na E85;	Concluída

Ocorrências (1)
- Rolo Compactador voltou a funcionar 09h; Maquinário com defeito

Comentários (0)


Galeria de Fotos (13)












GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA



Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua
