

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	45
				Data do relatório	03/10/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	0 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	0 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 14	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (16)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 4	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
- Execução de Sarjeta na E09 - LE: Foram executados 10m;	Concluída
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Em Andamento





*R. Santos*

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	46
				Data do relatório	04/10/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	0 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	0 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (17)						
Ajudante 6	Encarregado 1	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (16)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
- Execução de Sarjeta na E27 - LE: Foram executados 11m;	Concluída
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Concluída









*R. Santos*



<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	47
				Data do relatório	05/10/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	0 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	0 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
- Execução de Sarjeta na E27 - LD: Foram executados 11m;	Concluída
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Concluída

Galeria de Fotos (14)	
	







Recebimento de material



Assentamento de Tampas

*Ronaldinho*


<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	48
				Data do relatório	06/10/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	0 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	0 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	0 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
- Execução de Sarjeta na E50 - LD: Foram executados 05m;	Concluída
- Execução de Sarjeta na E50 - LE: Foram executados 05m;	Em Andamento
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Em Andamento

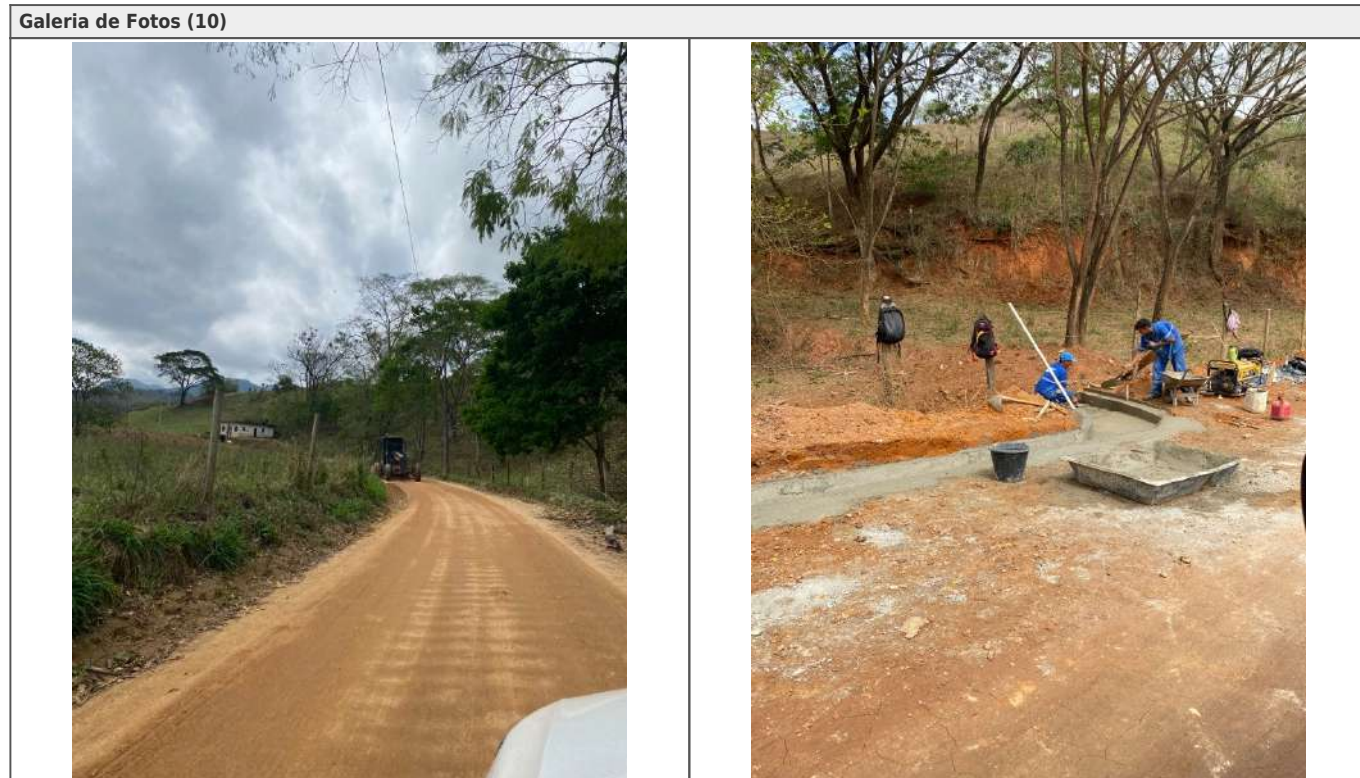

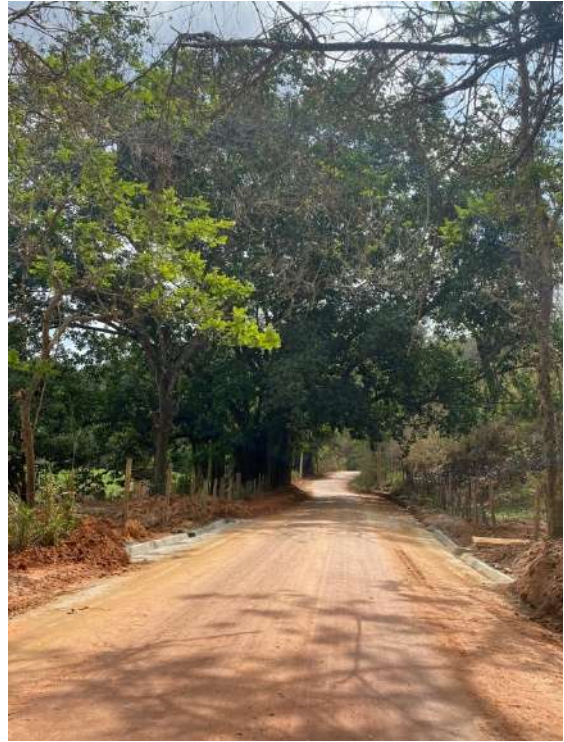



*Ronivaldo*

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	49
				Data do relatório	07/10/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	0 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	0 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 7	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
- As atividades do dia se resumiram em tentativas para mitigar as consequências causadas pela chuva: limpamos as áreas de maior risco, salgamos com areia/saibro os trechos mais críticos, retiramos os excessos de aterro e ficamos à disposição da comunidade.	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E73+10,00m - LE: Foram executados 05m;	Em Andamento
- Redistribuição de materiais de manilhamento ao longo do trecho;	Em Andamento





<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				<b>Relatório n°</b>	<b>50</b>
				<b>Data do relatório</b>	<b>10/10/2022</b>
				<b>Dia da semana</b>	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				<b>Contrato</b>	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	0 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	0 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

<b>Condição climática</b>	<b>Tempo</b>	<b>Condição</b>
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

<b>Mão de Obra (20)</b>						
Ajudante <b>4</b>	Encarregado <b>0</b>	Operador de Máquinas <b>13</b>	Pedreiro <b>2</b>			<i>Mão de Obra Direta <b>(19)</b></i>
Engenheiro <b>1</b>						<i>Mão de Obra Indireta <b>(1)</b></i>

<b>Equipamentos (15)</b>						
Betoneira <b>1</b>	Caminhão Pipa <b>2</b>	Escavadeira <b>1</b>	Caminhão Caçamba <b>3</b>	Gerador de energia <b>1</b>	Rolo compactador do tipo liso <b>1</b>	Trator com Grade <b>2</b>
Rolo compactador do tipo pata de carneiro <b>1</b>	Motoniveladora <b>2</b>	Retro Escavadeira <b>1</b>				

<b>Atividades (3)</b>	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E326 (Trecho2): Foram executados 7m de bueiro.	Concluída
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E543 (Trecho2): Foram executados 7m de bueiro.	Concluída
- Limpeza do trecho 1: remoção total de leiras causadas pela chuva;	Em Andamento


<b>Ocorrências (2)</b>
Rolo Liso parado o dia todo com problema; Maquinário com defeito
- Patrol New Holland parada com defeito: voltou 10h. Maquinário com defeito

<b>Galeria de Fotos (18)</b>
------------------------------







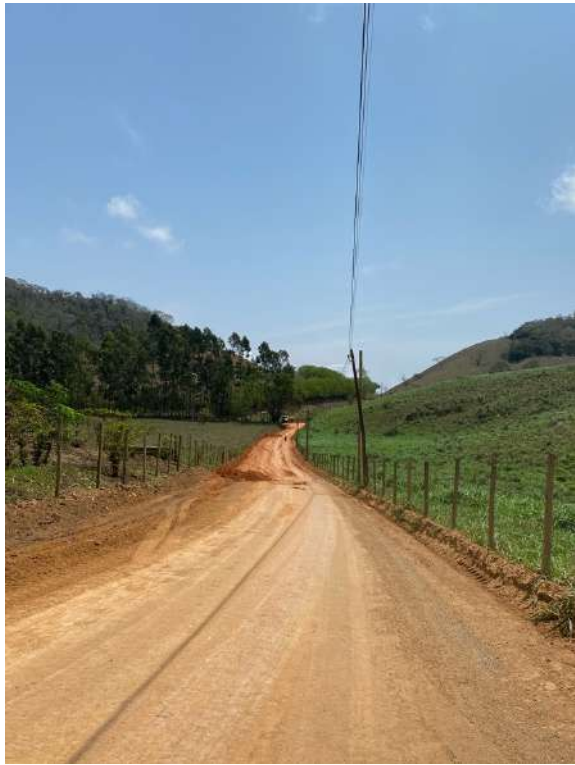



---

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	51
				Data do relatório	11/10/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	0 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	0 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (21)						
Ajudante 5	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (20)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
- Limpeza do trecho 1: remoção total de leiras causadas pela chuva;	Em Andamento
- Limpeza do trecho 2, a partir da E90: preparação da camada à ser tratada e retirado excesso de material perdido por conta da chuva.	Em Andamento
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E566+10m (Trecho2): Foram executados 8m de bueiro.	Concluída
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E630 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro.	Concluída

Ocorrências (3)
Rolo Liso parado o dia todo com problema; Maquinário com defeito
- Retroescavadeira deu problema: parou 13h. Maquinário com defeito
- Patrol New Holland furou pneu: 12h às 14h. Maquinário com defeito

Galeria de Fotos (20)
-----------------------











*Ron Carlos da Silva*



<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	52
				Data do relatório	12/10/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	0 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	0 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (22)						
Ajudante 6	Encarregado 0	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)


Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
- EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E669 (Trecho2): Foram executados 9m de bueiro.	Concluída
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E90 a E121 (620m) - 130L	Em Andamento
- Execução de vala e saídas onde foram feitos os bueiros nas propriedades dos moradores;	Concluída

Galeria de Fotos (20)	
	





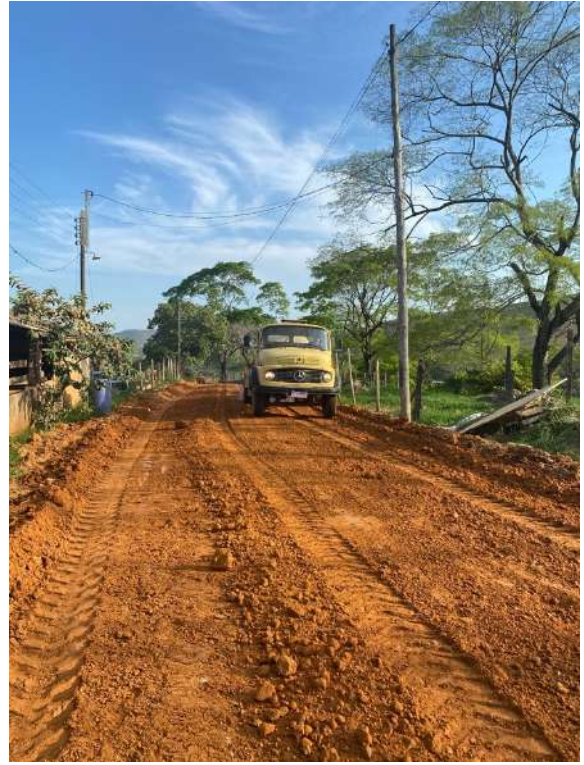





*Ronivaldo*

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	53
				Data do relatório	13/10/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	0 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	0 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (5)	
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E141 a E151 (200m) - 42L	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E73 - LE: Foram executados 7m;	Concluída
- Regularização e recomposição da via E141 a E160: retrabalho realizado por conta da chuva;	Concluída
- Salgamento do trecho recém aplicado;	Concluída
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E121 a E141 (400m) - 42L	Em Andamento

Ocorrências (2)
Retroescavadeira parada: problema no bico e bomba; Maquinário com defeito
Rolo liso parado; Maquinário com defeito


Galeria de Fotos (20)
-----------------------









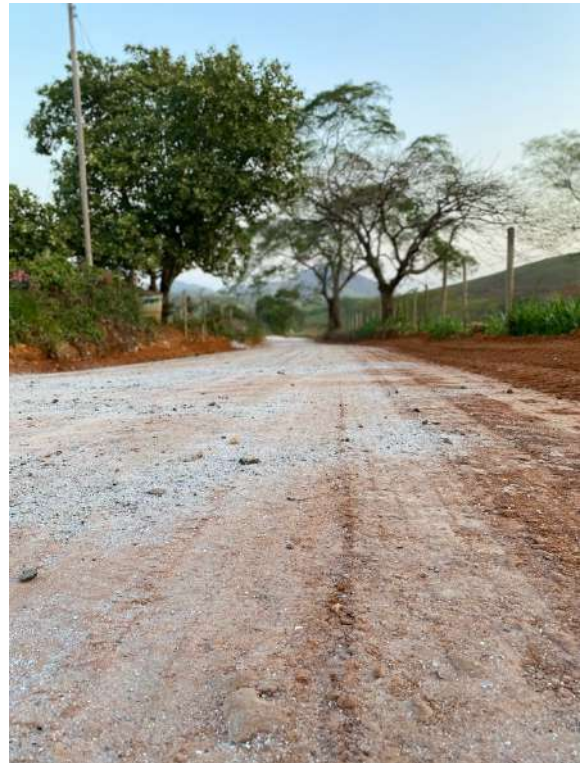

**Vídeos (2)**

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

00:05

[Vídeo 2 \(visualizar\).mp4](#)

00:06

<b>GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA</b>				Relatório n°	54
				Data do relatório	14/10/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	039/2022
<b>Obra</b>	<b>Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES</b>			<b>Prazo contratual</b>	0 dias
<b>Local</b>	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			<b>Prazo decorrido</b>	0 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	<b>Responsável</b>	Ramon Alves	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 8	Encarregado 0	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)


Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
- Finalização do trecho aplicado ontem: E141 a E151;	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E73 - LD: Foram executados 10m;	Concluída
- Conclusão de limpeza do Trecho 01;	Concluída
- Salgamento do trecho recém aplicado;	Concluída

Ocorrências (2)	
- Retroescavadeira parada: problema no bico e bomba; Maquinário com defeito	
- Alugada uma retroescavadeira na hora, para finalização do serviço; Maquinário com defeito	

Galeria de Fotos (10)
-----------------------



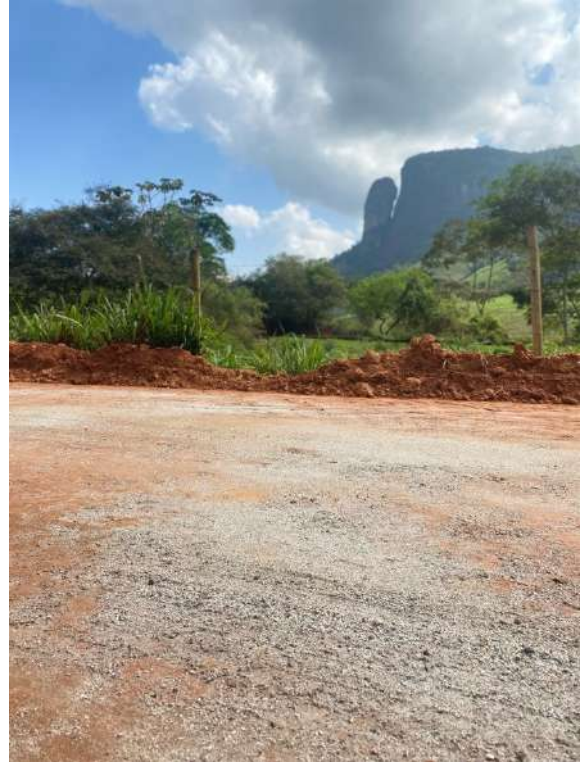



*Roberto Carlos*
