

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	55
				Data do relatório	17/10/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	78 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	44 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (22)						
Ajudante 6	Encarregado 0	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2			Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (5)	
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E151 a E186 (700m) - 147L	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E83 - LE: Foram executados 5m;	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E83 - LD: Foram executados 5m;	Em Andamento
- Remoção de pedras no trecho à ser tratado;	Concluída
- Recomposição da regularização perdida pós-chuvas;	Concluída

Ocorrências (1)
Retroescavadeira parada: problema no bico e bomba; Maquinário com defeito

Comentários (1)
THAIS EFFGEN 17/10/2022 18:40 Faltas: Luan e Arenildo (com justificativa)

Galeria de Fotos (17)











Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	56
				Data do relatório	18/10/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	79 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	43 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
- Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E186 a E207 (420m) - 95L	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E83 - LE: Foram executados 5m;	Em Andamento
- Execução de Sarjeta na E83 - LD: Foram executados 5m;	Em Andamento

Ocorrências (3)
- Retroescavadeira voltou a funcionar 9h30; Maquinário com defeito
- Quebra de Patrol New Holland: parou 12h. Maquinário com defeito
- Girico parado com problema no disco da embreagem; Maquinário com defeito

Galeria de Fotos (9)







GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	57
				Data do relatório	19/10/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	80 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	42 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
- Re-Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E00 a E09 (180m) - 36L	Concluída
- Execução de Sarjeta na E83 - LE: Foram executados 5m;	Em Andamento
- Início de bueiro na E599, porém tivemos dificuldade com a profundidade e muita pedra existente: precisamos parar o serviço e analisar a melhor solução;	Em Andamento

Ocorrências (1)
- Girico e Patrol New Holland parados; Maquinário com defeito

Galeria de Fotos (18)











Ronivaldo Alves


GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	58
				Data do relatório	20/10/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	81 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	41 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
- Execução de Sarjeta na E83 - LE: Foram executados 5m;	Em Andamento
- Início de bueiro na E599, porém tivemos dificuldade com a profundidade e muita pedra existente: precisamos parar o serviço e analisar a melhor solução;	Em Andamento

Galeria de Fotos (15)	
	









A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Costa', is written above a horizontal line.



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	59
				Data do relatório	21/10/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	82 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	40 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (24)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 13	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (23)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
- Execução de Sarjeta na E83 - LE: Foram executados 5m;	Em Andamento
- Início de bueiro na E599, porém tivemos dificuldade com a profundidade e muita pedra existente: precisamos parar o serviço e analisar a melhor solução;	Em Andamento

Galeria de Fotos (3)	
	



Ron Santo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	60
				Data do relatório	24/10/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	85 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	37 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 9	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)


Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (6)	
EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO: Equipe de laboratório presente realizando as coletas das amostras e executando os ensaios in situ;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Ajuste nas passagens já executadas;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: - EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E704 (Trecho2): Foram executados 8m de bueiro.	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: No bueiro da E704, tivemos que refazer e limpar o bebedouro dos animais por exigência do morador, para funcionamento da rede de drenagem;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Limpeza do trecho da E69 a E100;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento

Ocorrências (3)
- Motoniveladora New Holland parada: problema de vazamentos; Maquinário com defeito
- Girico parado com problema no disco de embreagem e com vazamentos; Maquinário com defeito
- Caminhão Pipa, Retroescavadeira e Rolo Liso (WB) sem operador; Maquinário com defeito

Galeria de Fotos (10)



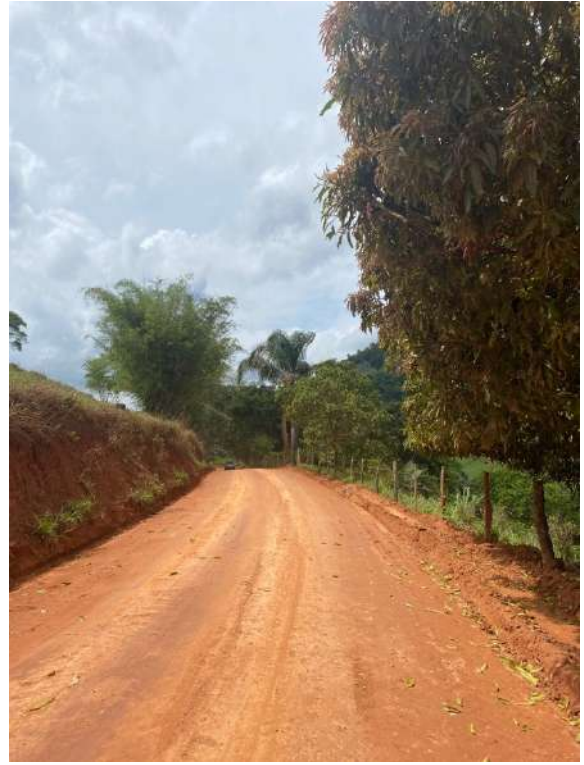



Ron Santos

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	61
				Data do relatório	25/10/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	86 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	36 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 9	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (7)	
- Equipe de laboratório presente realizando as coletas das amostras e executando os ensaios in situ;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Movimentação de materiais para execução de drenagem;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Limpeza para execução de caixa e ala na E326;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Conserto de cercas ao longo do trecho;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Continuação de limpeza no trecho de Santa Teresa;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Execução de caixas secas no trecho onde estava realizando a limpeza (pontos críticos);	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento

Ocorrências (3)
- Caminhão Pipa, Retroescavadeira e Rolo Liso (WB) sem operador; Falta de mão de obra
- Motoniveladora New Holland parada: problema de vazamentos - consertando; Maquinário com defeito
- Escavadeira hidráulica com problemas no buchamento do giro: precisará ser desmobilizada e ser colocada outra no lugar (dia perdido); Maquinário com defeito

Galeria de Fotos (12)







GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	62
				Data do relatório	26/10/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	87 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	35 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 10	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (15)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 3	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (6)	
- Equipe de laboratório presente realizando as coletas das amostras e executando os ensaios in situ - finalizando trecho de Santa Teresa;	Concluída
EQUIPE CIVIL: Preparação para execução de Sarjeta E113;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Continuação de limpeza no trecho 02, E100 a E120;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Execução de caixas secas no trecho onde estava realizando a limpeza (pontos críticos);	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Execução de Sarjeta na E113 - LE e LD: Foram executados 20m;	Concluída

Ocorrências (4)
- Caminhão Pipa (Irineu) quebrado: problemas no freio; Maquinário com defeito
- Motoniveladora New Holland parada: problema de vazamentos - consertando; Maquinário com defeito
- Escavadeira Hidráulica trocada - chegou 10h; Maquinário com defeito
- Retroescavadeira e Pipa sem operadores; Falta de mão de obra

Comentários (1)
THAIS EFFGEN 26/10/2022 14:15 Último dia da Caçamba Branca - Júnior Bredam

Galeria de Fotos (24)













GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	63
				Data do relatório	27/10/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	88 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	34 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 9	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (5)	
EQUIPE TRECHO: Continuação de limpeza no trecho 02, E120 a E160;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: - EXECUÇÃO DE BSTC Ø60 NA E714 (Trecho2): Foram executados 8m de bueiro.	Concluída
EQUIPE CIVIL: - EXECUÇÃO DE BOCA DE ALA Ø60 NA E326 (Trecho2);	Concluída
EQUIPE TRECHO: Execução de Quebra-Mola no trecho onde já era existente e ajuste nas sinalizações, na Com. Antas.	Concluída

Ocorrências (3)
- Motoniveladora New Holland parada: problema de vazamentos - consertando; Maquinário com defeito
- Pipa e Retroescavadeira (WB) sem operadores; Falta de mão de obra
- Ida do caminhão Amarelo (Sorriso) à Vila Velha para buscar os blocos para obra - Renan e Luan foram junto;

Galeria de Fotos (13)









Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	64
				Data do relatório	28/10/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	33 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (20)						
Ajudante 8	Operador de Máquinas 9	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (19)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
EQUIPE TRECHO: Continuação de limpeza no trecho 02, E160 a E180;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Execução de Caixa Coletora na E326;	Concluída
EQUIPE CIVIL: Distribuição de materiais;	Concluída

Ocorrências (1)
- Pipa e Retroescavadeira sem operadores; Falta de mão de obra

Galeria de Fotos (10)







Ron Cristiano

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	65
				Data do relatório	31/10/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	92 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	30 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (21)						
Ajudante 6	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (20)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
EQUIPE TRECHO: Continuação de limpeza no trecho 02, E180 a E190;	Concluída
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Reaplicação de trecho - E195 a E205	Concluída
EQUIPE CIVIL: Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E543;	Concluída

Galeria de Fotos (9)







A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Silva'.

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	66
				Data do relatório	01/11/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	122 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	93 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	29 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☔ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (22)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)


Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (5)	
EQUIPE CIVIL: Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E566+10m;	Concluída
EQUIPE DE TRECHO: Aplicação de Aditivo Permutador Iônico de Solos (APIS): E205 a E218 (260m) - 60L	27% - Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Salga de trecho nos pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: Limpeza de Trecho sentido à BR 101 para retirada de costelinhas à pedido da PMAV;	Concluída
EQUIPE CIVIL: Organização de materiais nos pontos de execução de drenagem;	Concluída

Ocorrências (1)
No final da tarde o tempo fechou e choveu, atrapalhando a conclusão do trecho e complicando um pouco o trecho recém aplicado. Todo trecho foi salgado, medida para mitigar o problema, mas infelizmente tivemos um tanto de transtorno. O trecho foi sinalizado informando para os veículos e motocicletas trafegarem devagar. Dia Chuvoso

Galeria de Fotos (19)



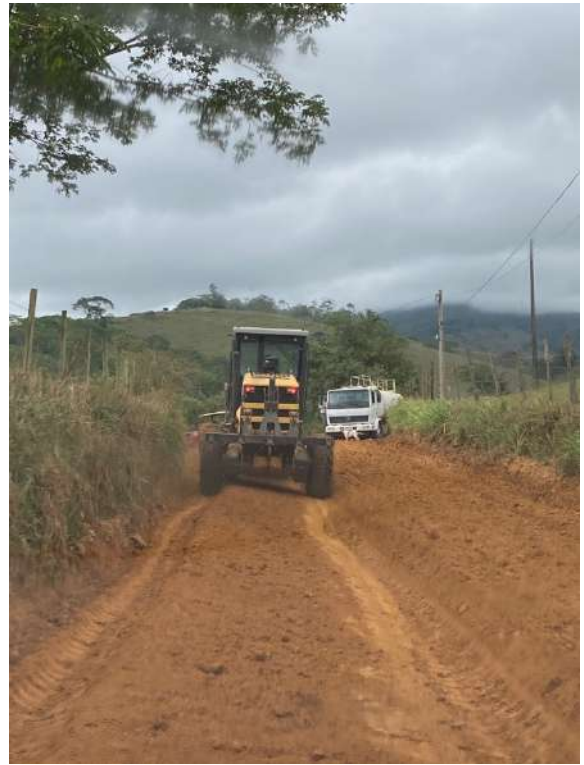







Vídeos (1)

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

00:09

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Silva", is located at the bottom left of the page.

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	67
				Data do relatório	02/11/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	94 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	211 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (22)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
DIA IMPRATICÁVEL: Devido às fortes chuvas não foi possível realizar nenhum tipo de trabalho. Ficamos à disposição da população.	Em Andamento

GLOBSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	68
				Data do relatório	03/11/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	95 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	210 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Mão de Obra (22)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
DIA IMPRATICÁVEL: Devido às fortes chuvas não foi possível realizar nenhum tipo de trabalho. Ficamos à disposição da população.	Em Andamento




GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	69
				Data do relatório	04/11/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	96 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	209 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável


Mão de Obra (22)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
Foi realizado o lançamento de material (solo-brita) nos pontos criticos do trecho.	Em Andamento

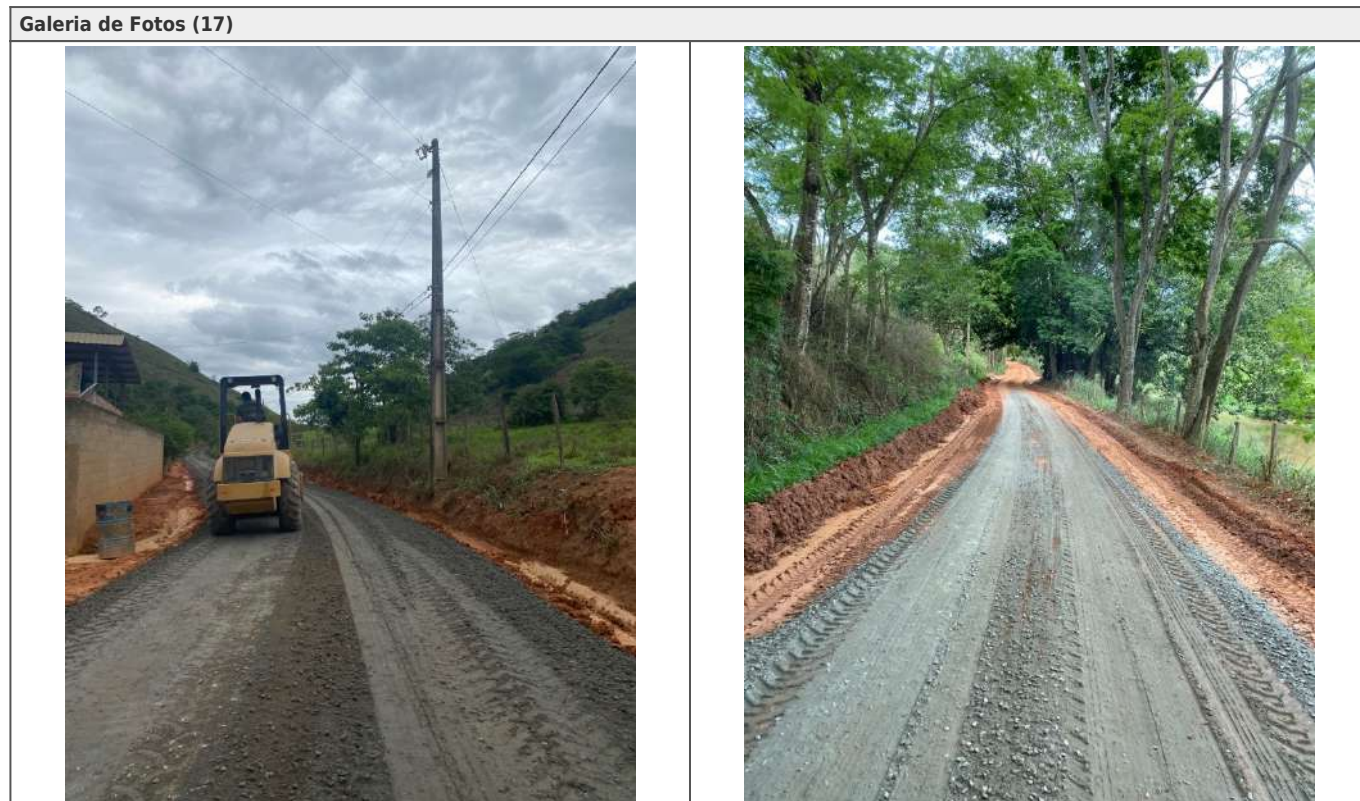

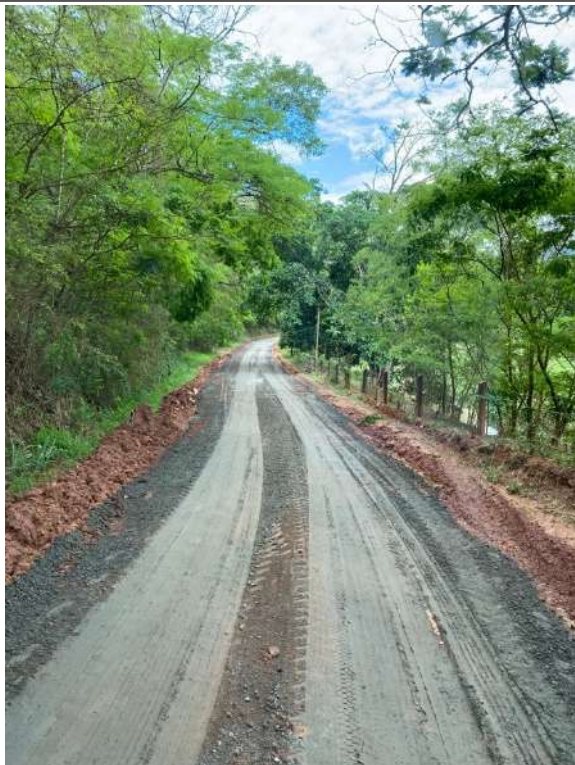

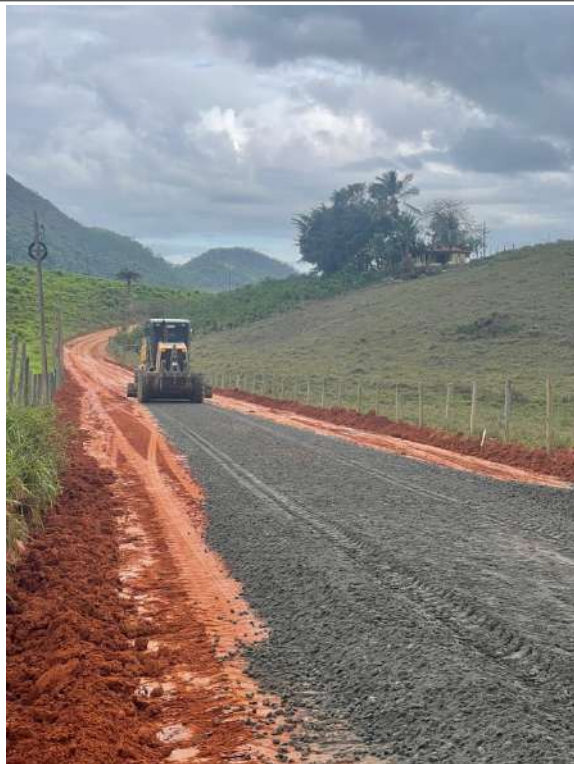





Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	70
				Data do relatório	07/11/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	99 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	206 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (22)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE CIVIL: - Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E599;	Concluída
EQUIPE TRECHO: - Limpeza e salga de trecho sentido à Comunidade Santa Teresa;	Concluída

Galeria de Fotos (12)	
	





Ron Carlos

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	71
				Data do relatório	08/11/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	100 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	205 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (22)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 12	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (21)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE CIVIL: - Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E608;	Concluída
EQUIPE TRECHO: - Limpeza e salga de trecho sentido à Comunidade Santa Teresa;	Em Andamento

Galeria de Fotos (15)	
	









Ronivaldo



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	72
				Data do relatório	09/11/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	101 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	204 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (14)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 2	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 2
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 2	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
Foi realizado o lançamento de material (solo-brita) nos pontos criticos do trecho, devido à forte chuva não pode ser feito muita coisa.	Em Andamento

Galeria de Fotos (3)	
	



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Costa'.

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	73
				Data do relatório	10/11/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	102 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	203 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)


Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE TRECHO: Foi realizado o lançamento de material (solo-brita) nos pontos críticos do trecho.	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Execução de tampas para caixas coletoras;	Concluída







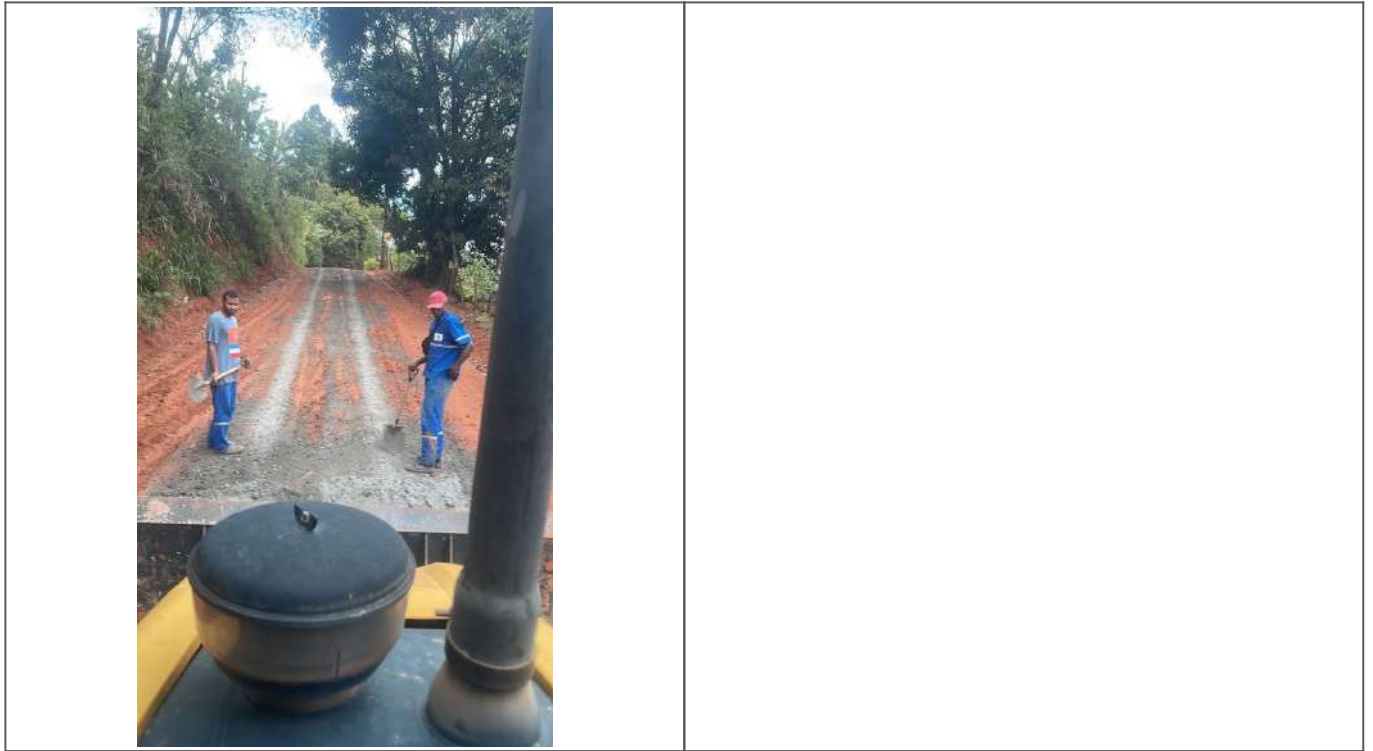

Ronivaldo

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	74
				Data do relatório	11/11/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	103 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	202 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Mão de Obra (18)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (17)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
EQUIPE CIVIL: - Execução de Caixa Coletora e Boca de Ala na E669;	Concluída
EQUIPE TRECHO: - Limpeza e salga de trecho e pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: - Limpeza de saída d'águas e sarjetas;	Em Andamento

Galeria de Fotos (14)	
	





